
零陵至道县公路项目（双牌县段）弃土场S-9土地复垦竣工图

561.58　　562.18

2850.76　　2850.36

土地复垦竣工面积统计表

临时用地编号	权属名称	一级地类	二级地类	①土地利用现状	②复垦规划目标	③复垦实施情况			增减	
				面积(ha)	面积(ha)	未使用面积(ha)	实际复垦面积(ha)	合计(ha)	③-①	③-②
弃土场S-9	打鼓坪乡河源村	林地	乔木林地	0.9751	1.4312	0.4733	0.9579	1.4312	0.4561	0.00
			其他林地	0.4561					-0.4561	0.00
	打鼓坪国有林场	林地	乔木林地	0.9259	0.9277	0.6075	0.3202	0.9277	0.0018	0.00
		交通运输用地	农村道路	0.0018					-0.0018	0.00
合计				2.3589	2.3589	1.0808	1.2781	2.3589	0.00	0.00

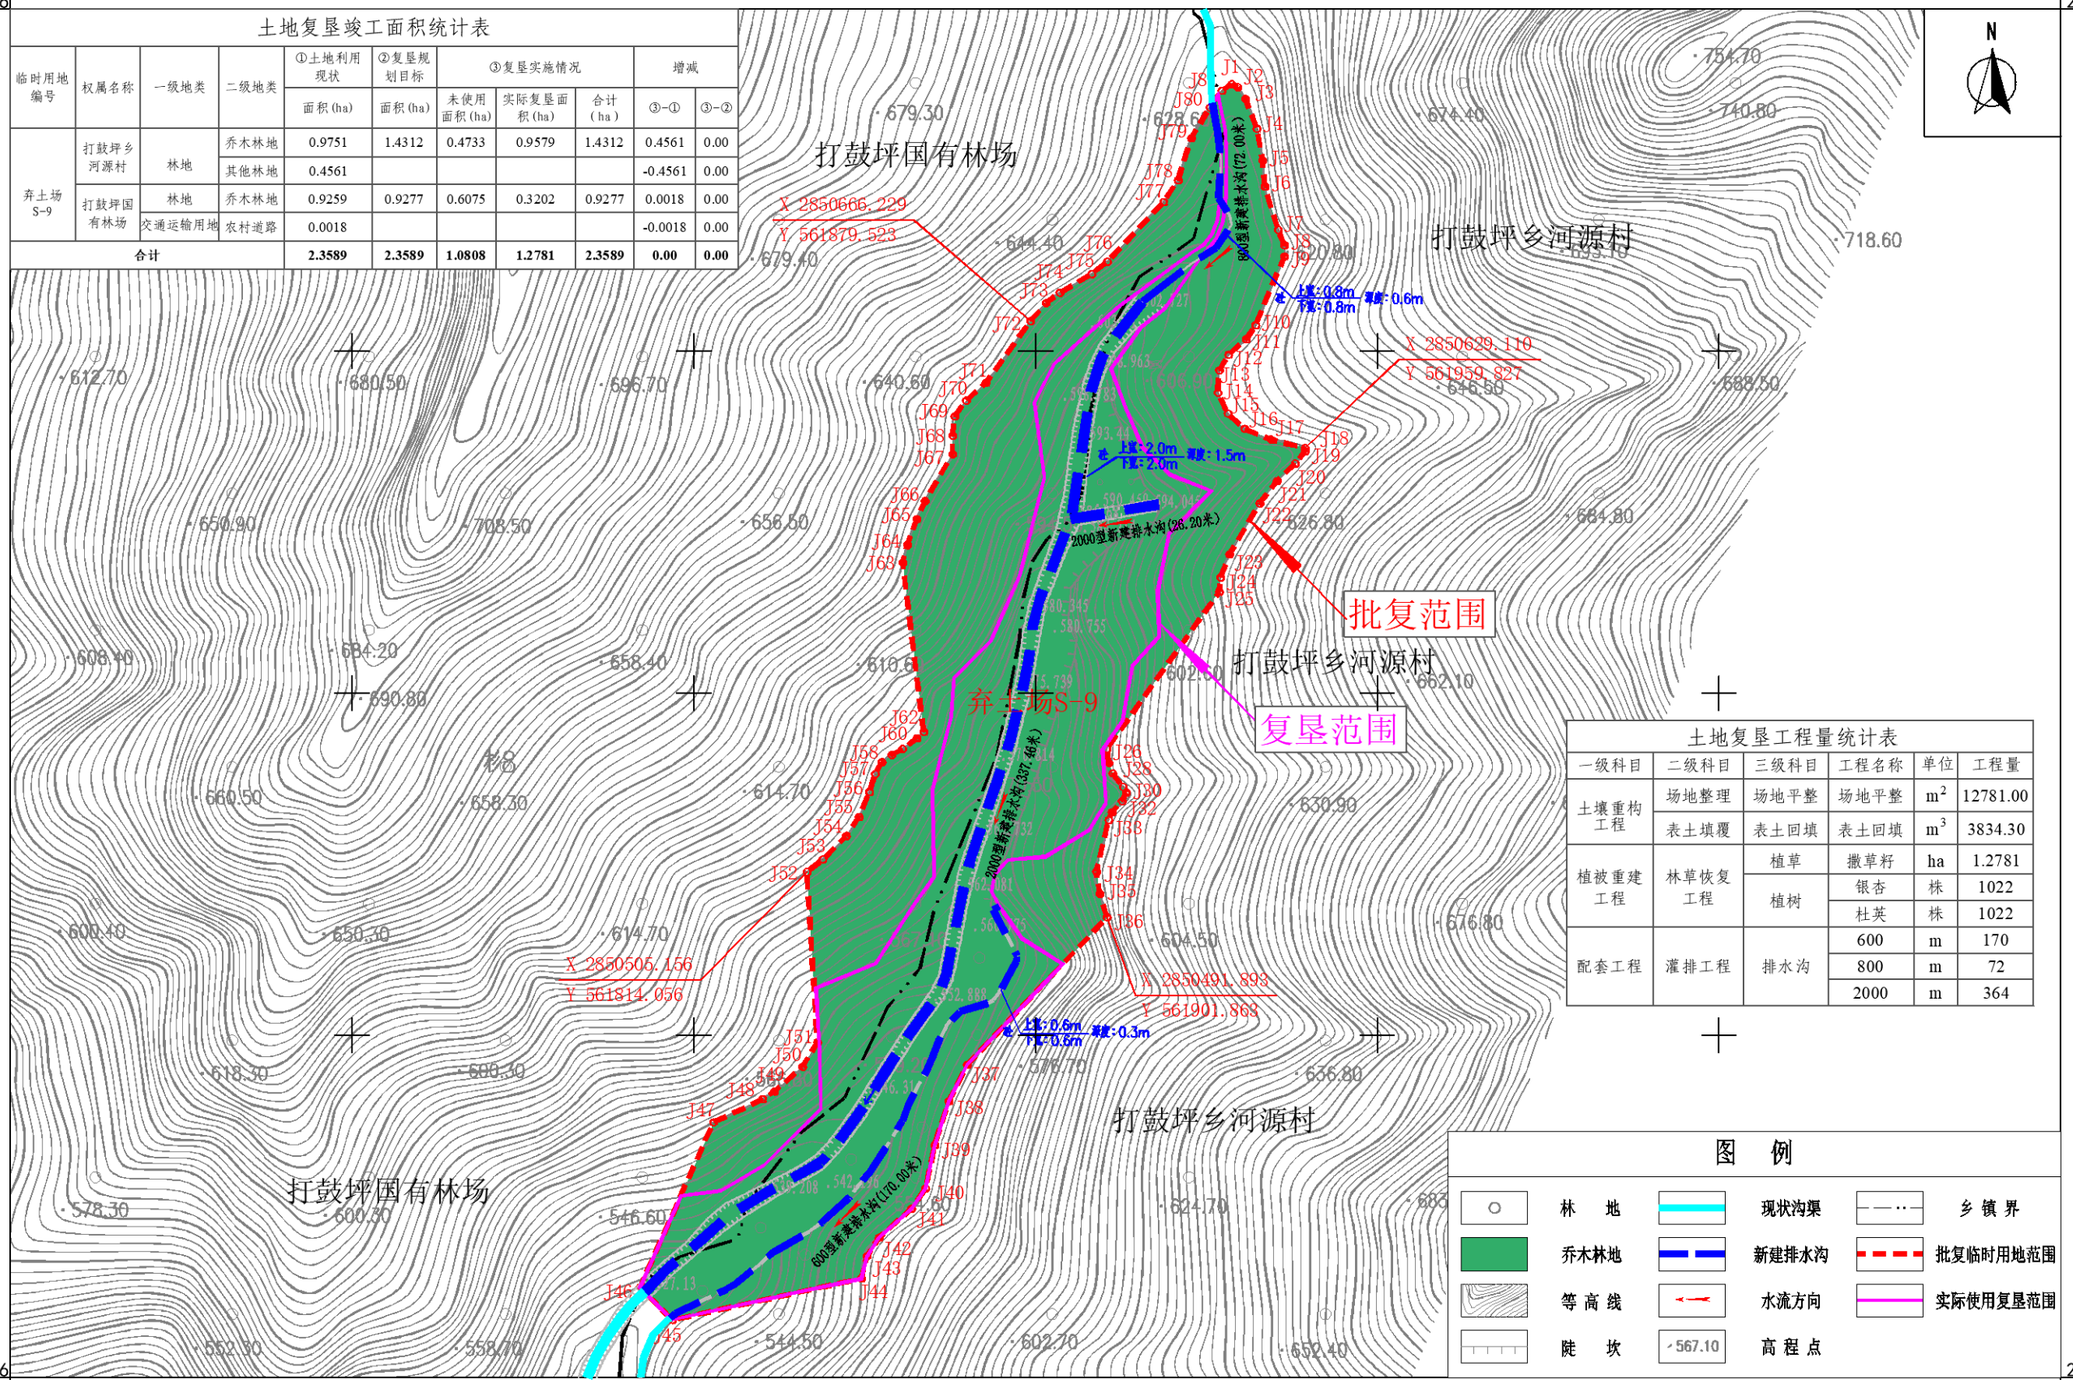

土地复垦工程量统计表

一级科目	二级科目	三级科目	工程名称	单位	工程量
土壤重构工程	场地整理	场地平整	场地平整	m^2	12781.00
	表土填覆	表土回填	表土回填	m^3	3834.30
植被重建工程	林草恢复工程	植草	撒草籽	ha	1.2781
		植树	银杏	株	1022
			杜英	株	1022
配套工程	灌排工程	排水沟	600	m	170
			800	m	72
			2000	m	364

图　例

林　地　　现状沟渠　　乡 镇 界

乔木林地　　新建排水沟　　批复临时用地范围

等 高 线　　水流方向　　实际使用复垦范围

陡　坎　　567.10 高 程 点

长沙佳源土地规划咨询有限责任公司

2026年7月数字化成图
2000国家大地坐标系
1985国家高程基准

1:2000

测量员：凌康强
绘图员：吴晨艺
检查员：刘　彪
